



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA

CNPJ: 13.830.236/0001-05 - CEP: . . - EUCLIDES DA CUNHA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 109-2020

EMPENHO: 477 / 2020	Nº SUB-EMPENHO: 51	TIPO DO EMPENHO: Global	
Data Empenho: 07/04/2020	Data Sub-Empenho: 02/09/2020	Data Liquidação: 02/09/2020	Data Pagamento: 03/09/2020

FORNECEDOR		Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome:	1347 - GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	Complemento:	
Endereço:	RUA 7 DE SETEMBRO, 1252	Cidade: ARACI	Estado: BA
Bairro:	TIRACOLO	CPF:	
CNPJ:	17.909.903/0001-92	Insc. Estadual:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1008.51.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	08.09. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	301 - Atenção Básica
Programa:	0009 - MAIS SAÚDE
Ação:	1.008 - INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	14 - Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: 002-2020TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 147-2020	240.000,00	200.000,00	40.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CAIXA D'ÁGUA. CONFORME BM 03. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2020. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020. NOTA FISCAL Nº 107.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	72.831,75	21.654,20	51.177,55

Data do Empenho: 07/04/2020	Data de Liquidação: 02/09/2020	Data do Pagamento: 03/09/2020
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Vinte e um mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos ##	Valor Bruto	21.654,20
---	--------------------	------------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 21.654,20 (Vinte e um mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), proveniente desta nota. Em,	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/09/2020
 ANDERSON FRANCA MACEDO DE SOUZA - SEC. SAÚDE Secretário(a) CPF : 019.816.595-10	 ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO Sec. de Finanças CPF : 012.396.575-60

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
624082-8	CUSTEIO SUS	3201-8	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123271	20.268,34

RECIBO
Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA a importância supra de R\$ 21.654,20 (Vinte e um mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de TED.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA

CNPJ: 13.830.236/0001-05 - CEP: - - EUCLIDES DA CUNHA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 109-2020

EMPENHO: 477 / 2020 Nº SUB-EMPENHO: 51 Data do Sub-Empenho: 02/09/2020 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome: 1347 - GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 1252 Complemento:
 Bairro: TIRACOLO Cidade: ARACI Estado: BA
 CNPJ: 17.909.903/0001-92 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data do Empenho: 07/04/2020
 Reduzido: 1008.51.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 06.09. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 - Saúde
 Sub-Função: 301 - Atenção Básica
 Programa: 0009 - MAIS SAÚDE
 Ação: 1.008 - INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	002-2020TP	240.000,00	200.000,00	40.000,00
Convênio:	Contrato: 147-2020			
Patrimônio:				

- HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA CAIXA D'AGUA. CONFORME BM 03. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2020. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020. NOTA FISCAL Nº 107.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	72.831,75	21.654,20	51.177,55



Data do Empenho: 07/04/2020 Data da Liquidação: 02/09/2020

RETENÇÕES		Valor
Código	Descrição	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.11	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - FONTE 14	952,78
2.1.8.8.1.01.08.00.10.00	ISS A RECOLHER - FONTE 14	433,08
## Vinte mil e duzentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos ##		1.385,86
		Valor Retido
		Valor Líquido
		20.268,34

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	02/09/2020	107	E			21.654,20

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		Valor R\$
Código	Descrição	
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	21.654,20

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/09/2020.  JOSE DE JESUS Técnico Contabilidade CPF : 927.703.985-04	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 02/09/2020, podendo efetuar o pagamento.  ANDERSON FRANCA MACEDO DE SOUZA - SEC. SAÚDE Secretário(a) CPF : 019.816.595-10
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI - BA
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota
000107

Data e Hora da Emissão
02/09/20 10:26

Período de Competência
09/20

Código de Verificação
109744250

Reg. Especial Tributação
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME
EPP)

Natureza da Operação
Tributação Fora do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 17.909.903/0001-92

Inscrição Municipal: 2591800

Nome/Razão Social: G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 1252, - CENTRO. CEP: 48760-000

Município: Araci

UF: BA

E-mail: GRSSILVACCEVENTOS@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS (SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO)

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

CNPJ: 13.698.774/0001-80

Endereço: R CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SN, - JEREMIAS. CEP: 48500-000

Município: Euclides da Cunha

UF: BA

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CAIXA D'ÁGUA Qtd: 1 Valor Unitário: 21.654,20 Valor Total: 21.654,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.654,20

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)
0,00

COFINS(R\$)
0,00

INSS(R\$)
0,00

IR(R\$)
0,00

CSLL(R\$)
0,00

Outras Retenções(R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)
21.654,20

Deduções(R\$)
12.992,52

Desconto Incondicionado(R\$)
0,00

Base de Cálculos(R\$)
8.661,68

Alíquota(%)
4,20

ISS(R\$)
0,00

ISS Retido(R\$)
363,79

Desconto Condicionado(R\$)
0,00


Valor Líquido(R\$)
21.290,41

Valor Total da Nota(R\$)
21.654,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03 CONTRATO: 147/2020 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 133 AGENCIA: 4002-9 CONTA: 505.492-3 60% Dedução material 40% mão de obra

Assinatura Digital: 109744250E42895E120A028D1519293C7C67E6305B5610D



Sergio Matricio de M. Fucs
Secretário Executivo de Obras,
Infraestrutura e Des. Urbanc
Decreto nº 1400/2018



GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA/BA - PLANILHA DE MEDIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEMODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 002/2020
OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
OBRA Nº: 10 - REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CAIXA DAGUA
EMPRESA: GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELIBOLETIM DE MEDIÇÃO: 3
PROCESSO ADM: 109/2020
CONTRATO Nº: 147/2020PERÍODO DA MEDIÇÃO: 11/08/2020 A 31/08/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses
INÍCIO DA OBRA: 07/04/2020

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 21.654,20

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Previsto em Contrato			Quantidades		Valores (R\$)				
			Quant.	Unitário	Total	Med. Per.	Med. Acum.	Med. Ant.	Med. Per.	Med. Acum.	Saldo	%
SERVIÇOS PRELIMINARES												
01.01.01	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	252,78	R\$ 252,78		1,00	252,78	-	252,78	-	100,00
01.01.02	Carga manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6m³ carga livre	m3		0,73	R\$ -			-	-	-	-	-
01.01.03	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	m3	6,00	28,48	R\$ 158,85		6,00	158,85	-	158,85	-	100,00
01.01.04	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, OMT 0,5 A 1,0 KM	m3	6,00	5,58	R\$ 33,45		6,00	33,45	-	33,45	-	100,00
COBERTURA												
01.02.01	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	361,50	53,13	R\$ 19.204,69		361,50	19.204,69	-	19.204,69	-	100,00
01.02.02	Limpeza de calha de zinco	m	90,00	15,90	R\$ 1.431,00		90,00	1.431,00	-	1.431,00	-	100,00
01.02.03	Cobertura em polícarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	20,28	252,03	R\$ 5.111,17		8,11	2.043,98	-	2.043,98	3.067,21	-
ESQUADRIAS, VIDROS E FERROS												
01.03.01	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (cabão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 joças de alisar	un		R\$ 238,53	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.02	Revisão de esquadrias de alumínio	m2		R\$ 103,38	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.03	Vidro liso incolor 3mm	m²		R\$ 125,00	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.04	Fechadura para porta de correr, bico de papagaio	un	1,00	R\$ 182,48	R\$ 182,48		1,00	182,48	-	182,48	-	100,00
01.03.05	Ferro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (parfis em PVC) marca Arafomos ou similar, instalado	m²		R\$ 37,38	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.06	Grade em metalon	m2	48,48	R\$ 331,20	R\$ 16.058,58			-	-	-	16.058,58	-
01.03.07	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vestar ou similar	Un	2,00	R\$ 228,18	R\$ 456,35		2,00	456,35	-	456,35	-	100,00
01.03.08	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m2		R\$ 554,69	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.09	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	m2		R\$ 202,81	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.10	Recolocação de forros em regua de pvc e parfis, considerando reaproveitamento do material	m2		R\$ 14,80	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.11	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alisar 2a e dobradiças	un		R\$ 753,80	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.12	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa - somente instalação. af_08/2015 p	un		R\$ 85,09	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.13	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un		R\$ 351,80	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.14	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un		R\$ 382,00	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.15	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un		R\$ 378,88	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.16	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un		R\$ 398,38	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.17	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un		R\$ 359,63	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.18	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un		R\$ 408,20	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.19	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un		R\$ 392,35	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.20	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	un		R\$ 78,78	R\$ -			-	-	-	-	-
01.03.21	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	3,00	R\$ 113,93	R\$ 341,78		3,00	341,78	-	341,78	-	100,00

GRS SILVA
C.R.P.: 11.000.000/0001Argio Matriciada M. Fucs
Secretário Executivo de Obras
Infraestrutura e Des. Urbano
Decreto nº 1400/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA/BA - PLANILHA DE MEDIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 002/2020
OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
OBRA Nº: 10 - REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CAIXA DAGUA
EMPRESA: GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 3
PROCESSO ADM: 109/2020
CONTRATO Nº: 147/2020

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 11/08/2020 A 31/08/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses
INÍCIO DA OBRA: 07/04/2020

VALOR MEDIÇÃO: R\$ **21.654,20**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Previsto em Contrato			Quantidades		Valores (R\$)					
			Quant.	Unitário	Total	Med. Per.	Med. Acum.	Med. Ant.	Med. Per.	Med. Acum.	Saldo	%	
01.06.15	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un		R\$ 24,85	R\$ -								
01.06.16	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un		R\$ 33,09	R\$ -								
01.06.17	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un		R\$ 46,11	R\$ -								
01.06.18	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	27,00	R\$ 33,68	R\$ 908,89	27,00	27,00	-	908,89	908,89	-	100,00	
01.06.19	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento e instalação	un		R\$ 15,35	R\$ -								
01.06.20	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w, - fornecimento e instalação. af. 11/2017	un		R\$ 35,14	R\$ -								
01.06.21	Lâmpada tubular fluorescente t10 de 20/40 w, base g13 - fornecimento e instalação. af. 11/2017 p	un		R\$ 36,99	R\$ -								
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS													
01.07.01	Revisão de ponto de água tipo 2	un	1,00	R\$ 72,74	R\$ 72,74	1,00	1,00	-	72,74	72,74	-	100,00	
01.07.02	Revisão de ponto de água tipo 1	un		R\$ 24,59	R\$ -								
01.07.03	Revisão de ponto de água tipo 3	un		R\$ 145,36	R\$ -								
01.07.04	Tomada de bóia p/caba d'água em pvc d = 1/2"	un		R\$ 25,40	R\$ -								
01.07.05	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un		R\$ 34,04	R\$ -								
01.07.06	Capa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un		R\$ 56,69	R\$ -								
01.07.07	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un		R\$ 12,39	R\$ -								
01.07.08	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional, incepta ou similar	un		R\$ 44,65	R\$ -								
01.07.09	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un		R\$ 316,81	R\$ -								
01.07.10	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	un		R\$ 56,23	R\$ -								
01.07.11	Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamaçã ou similar, capacidade 30	un		R\$ 126,58	R\$ -								
01.07.12	Tomada cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar	un		R\$ 59,68	R\$ -								
01.07.13	Tomada cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un		R\$ 68,04	R\$ -								
01.07.14	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un		R\$ 18,79	R\$ -								
01.07.15	Greixa p/ralo em pvc, quadrada, 15x15cm, tigre ou similar	un		R\$ 7,83	R\$ -								
01.07.16	Fornecimento e Assentamento de Caixa de Proteção de policarbonato p/ligação em parede	un	1,00	R\$ 104,94	R\$ 104,94	1,00	1,00	-	104,94	104,94	-	100,00	
01.07.17	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 107,93	R\$ 215,85	2,00	2,00	-	215,85	215,85	-	100,00	
01.07.18	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un		R\$ 7,08	R\$ -								
01.07.19	Sifão do tipo flexível em pvc 1 1/2" x 1 1/2" - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	10,00	R\$ 10,48	R\$ 104,88	10,00	10,00	-	104,88	104,88	-	100,00	
01.07.20	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un		R\$ 14,58	R\$ -								
01.07.21	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un		R\$ 438,98	R\$ -								
01.07.22	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5" cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	1,00	R\$ 308,23	R\$ 308,23	1,00	1,00	-	308,23	308,23	-	100,00	
01.07.23	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	1,00	R\$ 161,23	R\$ 161,23	1,00	1,00	-	161,23	161,23	-	100,00	
01.07.24	Tomada cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af. 12/2013	un	6,00	R\$ 102,23	R\$ 613,35	6,00	6,00	-	613,35	613,35	-	100,00	
01.07.25	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. af. 12/2014	un		R\$ 31,09	R\$ -								
01.07.26	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un		R\$ 10,78	R\$ -								
01.07.27	Hidrômetro dn 25 (1/2"), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. af. 11/2016	un		R\$ 202,55	R\$ -								
PINTURA													
01.08.01	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lbramento e retoques - Rev 03	m²	384,30	R\$ 13,28	R\$ 5.101,58	192,15	384,30	2.550,79	2.550,79	5.101,58	-	100,00	
01.08.02	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m²	1.496,21	R\$ 15,24	R\$ 22.798,50	598,48	1.496,21	13.881,41	9.117,10	22.798,50	-	100,00	

Cecilia...
Unid: 1...

Sérgio Maurício de M. Fucci
Secretário Executivo de Obra:
Infraestrutura e Des. Urban
Decreto nº 1400/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA/BA - PLANILHA DE MEDIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 002/2020
OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
OBRA Nº: 10 - REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CAIXA DAGUA
EMPRESA: GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 3
PROCESSO ADM: 109/2020
CONTRATO Nº: 147/2020

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 11/08/2020 A 31/08/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses
INÍCIO DA OBRA: 07/04/2020

VALOR MEDIÇÃO: R\$ **21.864,20**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Previsto em Contrato			Quantidades		Valores (R\$)						
			Quant.	Unitário	Total	Med. Per.	Mod. Asum.	Med. Ant.	Mod. Per.	Med. Asum.	Saldo	%		
01.08.03	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²		R\$ 15,79	R\$ -									
01.08.04	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas - R1	m²	45,80	R\$ 17,74	R\$ 812,38	27,48	45,80	325,00	487,39	812,38	-	100,00		
01.08.05	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, fixamento e retoques - Rev 01	m²	30,00	R\$ 15,09	R\$ 452,63	18,00	30,00	181,08	271,55	452,63	-	100,00		
01.08.06	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m²	268,05	R\$ 22,80	R\$ 6.065,94	53,21	268,05	4.852,75	1.213,19	6.065,94	-	100,00		
01.08.07	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, tres demaos	m²		R\$ 22,01	R\$ -									
01.08.08	Pintura epoxi para piso	m2		R\$ 13,60	R\$ -									
01.08.09	Calçao int ou ext sobre revestimento fiso c/adoçao de fixador com com duas demaos	m²		R\$ 12,21	R\$ -									
01.08.10	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	m2	47,25	R\$ 21,79	R\$ 1.029,46	28,35	47,25	411,83	617,63	1.029,46	-	100,00		
01.08.11	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco	m²		R\$ 28,56	R\$ -									
01.08.12	Pintura acrílica em piso cimentado duas demaos	m²		R\$ 18,18	R\$ -									
01.08.13	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	5,00	R\$ 19,13	R\$ 95,63		5,00	95,63		95,63	-	100,00		
01.08.14	Pintura com tinta impermeavel mineral em po, duas demaos	m2		R\$ 13,49	R\$ -									
01.08.15	APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS	m²		R\$ 29,04	R\$ -									
01.08.16	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. af 08/2014	m²		R\$ 3,11	R\$ -									
01.08.17	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af 08/2014	m2		R\$ 16,30	R\$ -									
01.08.18	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af 08/2014	m2	120,30	R\$ 14,15	R\$ 1.702,25	60,15	120,30	851,12	851,12	1.702,25	-	100,00		
01.08.19	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af 09/2016	m2	6,00	R\$ 14,63	R\$ 87,75		6,00	87,75		87,75	-	100,00		
01.08.20	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	36,60	R\$ 49,54	R\$ 1.813,07	36,60	36,60	-	1.813,07	1.813,07	-	100,00		
OUTROS														
01.09.01	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m²		R\$ 183,38	R\$ -									
01.09.02	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de primer para colagem de manta asfáltica (exclusivo a manta asfáltica)	m2		R\$ 20,79	R\$ -									
01.09.03	Suporte em barra chata de ferro 7/8" x 1/4", tipo U, h = 0,33m, comp = 1,00m	un		R\$ 40,00	R\$ -									
01.09.04	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	m		R\$ 168,73	R\$ -									
01.09.05	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 12/2015	kg		R\$ 12,61	R\$ -									
ENCERRAMENTO DA OBRA														
01.10.01	Limpeza geral	m²	309,25	R\$ 2,15	R\$ 664,89						664,89	-		
TOTAL GERAL:					R\$ 22.978,88			R\$ 61.134,12	21.624,20	73.188,32	18.788,68	78,70		

GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.016.000/0001-91

EMPRESA RESP. PELA EXECUÇÃO		FISCALIZAÇÃO - COMISSÃO		FISCALIZAÇÃO - COMISSÃO		FISCALIZAÇÃO - ENGENHEIRO	
GRS Silva Construções Eireli CNPJ: 17.016.000/0001-91						Sérgio Matucio de M. R.L. Secretário Executivo de Chr Infraestrutura e Des. Urba Decreto nº 1459/2020	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
Praça da Conceição, Nº 04 - Centro
Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel.: (75) 3266-2146 CNPJ: 14.232.086/0001-92

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - ECONÔMICO

RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nome

G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI

Endereço

RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO

Município

ARACI

Estado

BA

CNPJ/CPF

17.909.903/0001-92

Inscrição Municipal

2591800

Data Emissão

10/08/2020

Código de controle da certidão: **439827802B**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito da PGM e SFM. Válida até **08/11/2020**.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade desta certidão pode ser conferida em: www.siam.org.br/ba/araci.

Certificação Digital: 439827802B



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20202222280

RAZÃO SOCIAL	
G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
108.196.113 - INAPTO	17.909.903/0001-92

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/08/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 17.909.903/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:03:39 do dia 17/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2020.

Código de controle da certidão: **DABF.E0A4.2D92.DB9C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.909.903/0001-92
Certidão nº: 18056168/2020
Expedição: 04/08/2020, às 08:00:53
Validade: 30/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.909.903/0001-92, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 17.909.903/0001-92**Razão****Social:**

G R S SILVA CONSTRUCOES COMERCIO E EVENTOS LTDA ME

Endereço:

R 7 DE SETEMBRO 1252 / TIRACOLO / ARACI / BA / 48760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/08/2020 a 29/09/2020**Certificação Número:** 2020083104123988069526

Informação obtida em 02/09/2020 09:40:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- MED 03

Obra:	Reforma Unidade Básica de Saúde Caixa D'agua		
Local:	Euclides da Cunha	Contrato:	147/2020
Contratada:	GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI		
<u>Unidade Básica de Saúde Caixa D'agua (Bairro Caixa D'agua)</u>			

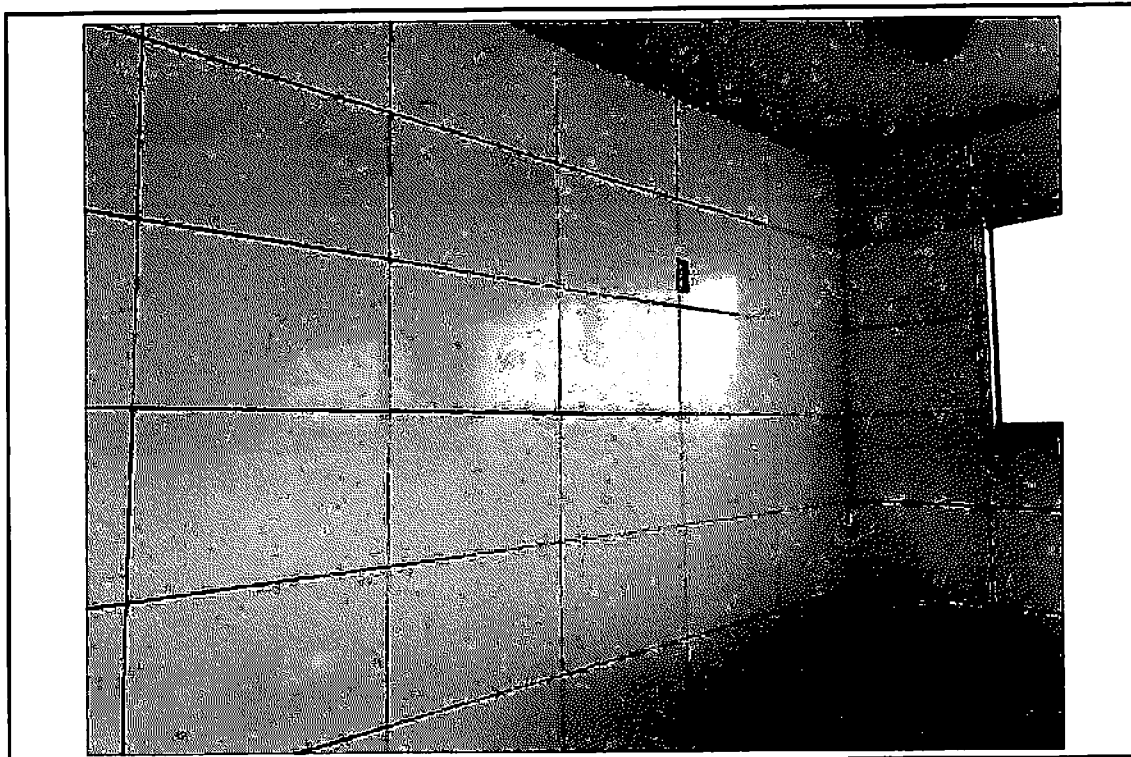


Foto 01: Revestimento Cerâmico.



Foto 02: revestimento.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- MED 03


Obra:	Reforma Unidade Básica de Saúde Caixa D'agua		
Local:	Euclides da Cunha	Contrato:	147/2020
Contratada:	GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI		
<u>Unidade Básica de Saúde Caixa D'agua (Bairro Caixa D'agua)</u>			



Foto 03: Pintura.



Foto 04: Pintura.



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 147/2020.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 147/2020
CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
EUCLIDES DA CUNHA E PELA EMPRESA GRS
SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI QUE TEM POR
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA
PARA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE - UBS, NO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA
CUNHA - BA.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha, inscrito no CNPJ (MF) n.º 13.697.774/0001-80, com sede no Centro Administrativo Municipal, s/nº, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha - Bahia, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS**

CONTRATADA: GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) n.º 17.909.903/0001-92, localizada na Rua 7 de Setembro 1252, Bairro Tiracolo, Aracá - BA, neste ato representado pelo Sr. Gerson de Jesus Santos, portador do RG de n.º 06.405.707-07 e CPF n.º 876.730.885-68

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 147/2020 proveniente da TOMADA DE PREÇO N.º 002/2020 e Processo Administrativo 109/2020, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto termo de Supressão de 3,87% (três inteiros e setenta e sete centésimos por cento) que corresponde a R\$ 30.572,92 (trinta mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos) e Majoração de 45,47 % (quarenta e cinco inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) que corresponde a 390.082,39 (trezentos e noventa mil oitenta e dois reais e trinta e nove centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRÉCIMO

2.1. O valor Original do contrato é de R\$ 790.651,91 (setecentos e noventa mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos)


2.2. O Valor do contrato após a majoração ficará R\$ 1.150.161,38 (um milhão cento e cinquenta mil cento e sessenta e um reais e trinta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA

4.1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, se dará pela seguinte Dotação Orçamentaria

Centro Administrativo Municipal, s/nº, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500 - 000, Telefax: (75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/0001-80

35



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha

Categoria Econômica: Órgão: 06.09– Fundo Municipal de Saúde; Projeto/atividade: 1.008 – Investimento nos equipamentos da atenção Básica de saúde; Fonte: 02/14
Elemento de despesa: 4.4.90.51 – Obras e instalações.

4.2. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUARTA- DO FUNDAMENTO LEGAL


5.1 O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal, e encontra amparo legal no artigo 65, alínea “b” do inciso I, combinada com o § 1º, da Lei n.º 8.666/93.


CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

6.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Euclides da Cunha, 23 de Junho de 2020.


Luciano Pinheiro Damasceno e Santos
Prefeito Municipal


GRS SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI
Gerson de Jesus Santos
Representante
Empresa



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	BA 291070 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	3201/006/00624082-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.830.236/0001-05

Banco:	133 - CONF NAC COOP CRESOL
Conta Destino:	4002/00000505492-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	GRS SILVA CONSTRUCOES EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	17.909.903/0001-92
Valor:	R\$ 20.268,34
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGTO PREST SERVICOS
Histórico:	TED

Data de Débito:	03/09/2020
Data da Operação:	03/09/2020
Código da Operação:	00123271
Chave de Segurança:	C3PV5STRLJQ9ZZX8
Operação realizada com sucesso.	
